


برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۱۳۹۹						
								Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1
۱		پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱	۵۴۷ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۰۰		[Gantt Bar]						
۲	۱.۱	مایلستون ها	۴۵۸ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰		[Gantt Bar]						
۳	۱.۱.۱	شروع عملیات اجرایی باقیمانده پروژه	۰ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰		[Gantt Bar]						
۴	۱.۱.۲	شروع عملیات سفت کاری	۰ روز	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۰		[Gantt Bar]						
۵	۱.۱.۳	شروع عملیات گچ کاری	۰ روز	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰		[Gantt Bar]						
۶	۱.۱.۴	فراهم شدن شرایط تکمیل همکف و لابی و پارکینگ ها	۰ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰		[Gantt Bar]						
۷	۱.۱.۵	فراهم شدن شرایط نصب پنجره	۰ روز	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۰		[Gantt Bar]						
۸	۱.۱.۶	فراهم شدن شرایط فینشینگ پروژه	۰ روز	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۰		[Gantt Bar]						
۹	۱.۲	تجهیز کارگاه	۱۰۰ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۰.۲۴		[Gantt Bar]						
۱۰	۱.۲.۱	نصب حفاظ پیرامونی محدوده پروژه و درب ها / تجهیز کارگاه	۵ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	اکیپ جوشکاری ۲ نفره	[Gantt Bar]						
۱۱	۱.۲.۲	ساخت انبار موقت / تجهیز کارگاه	۲ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۰.۰۷	اکیپ بنایی ۲ نفره	[Gantt Bar]						
۱۲	۱.۲.۳	نصب کانکس ها / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۰.۰۲	اکیپ تجهیز کارگاه ۱ نفره	[Gantt Bar]						
۱۳	۱.۲.۴	اجرای سازه فلزی نگهدارنده کانکس ها / تجهیز کارگاه	۲ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۰.۰۵	اکیپ جوشکاری ۲ نفره	[Gantt Bar]						
۱۴	۱.۲.۵	تجهیز داخلی کانکس ها / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۰۲	اکیپ تجهیز کارگاه ۱ نفره	[Gantt Bar]						
۱۵	۱.۲.۶	راه اندازی انشعاب آب / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰.۰۲	اکیپ تجهیز کارگاه ۱ نفره	[Gantt Bar]						
۱۶	۱.۲.۷	راه اندازی انشعاب فاضلاب / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰.۰۲	اکیپ تجهیز کارگاه ۱ نفره	[Gantt Bar]						
۱۷	۱.۲.۸	ساخت سرویس بهداشتی / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره	[Gantt Bar]						
۱۸	۱.۲.۹	راه اندازی انشعاب برق و نصب تابلو برق / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۰.۰۲	اکیپ تجهیز کارگاه ۱ نفره	[Gantt Bar]						
۱۹	۱.۲.۱۰	تعیین و آماده سازی محل دیوی سیمان در کارگاه / تجهیز کارگاه	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۰.۰۲	اکیپ تجهیز کارگاه ۱ نفره	[Gantt Bar]						
۲۰	۱.۳	گود، سازه نگهبان، اسکلت بتنی، دیوار حائل و سقف ها	۲۳۹ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳.۵۲		[Gantt Bar]						
۲۱	۱.۳.۱	تخریب و خاکبرداری و پی کنی	۱۴ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۰.۱		[Gantt Bar]						
۲۲	۱.۳.۱.۱	تخریب ساختمان قدیمی	۱۰ روز	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰	اکیپ تخریب ۳ نفره	[Gantt Bar]						
۲۳	۱.۳.۱.۲	خاکبرداری	۲ روز	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰.۰۷	اکیپ عملیات خاکی ۳ نفره	[Gantt Bar]						
۲۴	۱.۳.۱.۳	پیاده کردن نقشه روی زمین(نقشه برداری)	۲ روز	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۰.۰۳	اکیپ نقشه برداری ۲ نفره	[Gantt Bar]						
۲۵	۱.۳.۲	فونداسیون	۱۴ روز	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱.۱۱		[Gantt Bar]						
۲۶	۱.۳.۲.۱	حفر چاله آسانسور	۱ روز	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۰.۰۲	اکیپ عملیات خاکی ۳ نفره	[Gantt Bar]						
۲۷	۱.۳.۲.۲	تسطیح و رگلاژ فونداسیون	۱ روز	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰.۰۷	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۲۸	۱.۳.۲.۳	اجرای بتن مگر فونداسیون	۱ روز	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۰.۰۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۲۹	۱.۳.۲.۴	آرماتور بندی فونداسیون	۵ روز	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۰.۴۸	اکیپ اسکلت بتنی ۶ نفره	[Gantt Bar]						
۳۰	۱.۳.۲.۵	قالب بندی فونداسیون	۵ روز	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰.۴۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۳۱	۱.۳.۲.۶	بتن ریزی فونداسیون	۱ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰.۰۷	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۳۲	۱.۳.۳	دیوار حائل	۰ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰		[Gantt Bar]						
۳۳	۱.۳.۳.۱	آرماتوربندی دیوار حائل	۰ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۳۴	۱.۳.۳.۲	قالب بندی دیوار حائل	۰ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۳۵	۱.۳.۳.۳	بتن ریزی دیوار حائل	۰ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						
۳۶	۱.۳.۴	اسکلت	۲۱۱ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۲.۳۱		[Gantt Bar]						
۳۷	۱.۳.۴.۱	طبقه همکف	۳۳ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱.۶۷		[Gantt Bar]						
۳۸	۱.۳.۴.۱.۱	ستون/ طبقه همکف/ اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱.۱۳		[Gantt Bar]						
۳۹	۱.۳.۴.۱.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها/ طبقه همکف/ اسکلت	۶ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره	[Gantt Bar]						

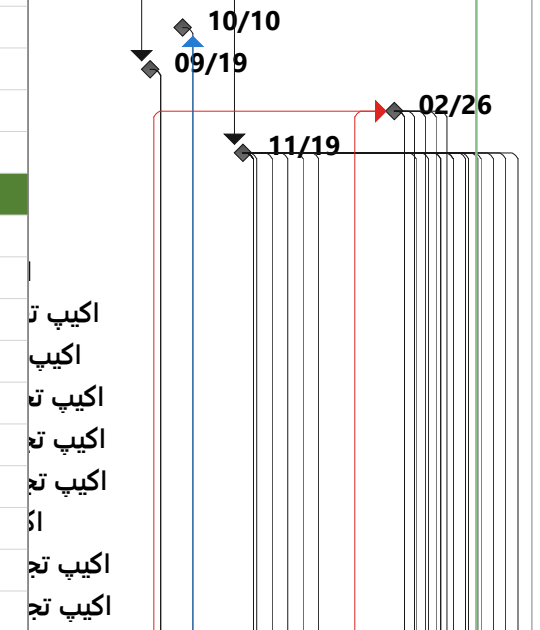

Project Planning Consultant: Farhad Jalali-09124851030	Task	[Blue Bar]	Inactive Task	[White Bar]	Manual Summary Rollup	[Green Bar]	External Milestone	[Diamond]	Manual Progress	[Red Bar]
	Split	[Dotted Bar]	Inactive Milestone	[Diamond]	Manual Summary	[Black Bar]	Deadline	[Down Arrow]		
	Milestone	[Diamond]	Inactive Summary	[Grey Bar]	Start-only	[Blue Bar]	Critical	[Red Bar]		
	Summary	[Black Bar]	Manual Task	[Green Bar]	Finish-only	[Blue Bar]	Critical Split	[Dotted Bar]		
	Project Summary	[Black Bar]	Duration-only	[Green Bar]	External Tasks	[Grey Bar]	Progress	[Blue Bar]		

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۹	Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1
۴۰	۱.۳.۴.۱.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه همکف / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۱	۱.۳.۴.۱.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه همکف / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۲	۱.۳.۴.۱.۲	سقف / طبقه همکف / اسکلت	۱۹ روز	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰.۵۵									
۴۳	۱.۳.۴.۱.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله همکف به اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۴	۱.۳.۴.۱.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه همکف / اسکلت	۱۰ روز	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰.۳۴	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۵	۱.۳.۴.۱.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه همکف / اسکلت	۹ روز	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰.۰۹	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۶	۱.۳.۴.۱.۲.۴	آرماتور بندی شمشیری پله همکف به اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰.۰۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۷	۱.۳.۴.۱.۲.۵	جانمایی لوله های تاسیسات و ونت ها در سقف اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰.۰۳	اکیپ مکانیکال ۲ نفره								
۴۸	۱.۳.۴.۱.۲.۶	بتن ریزی سقف / طبقه همکف / اسکلت	۱ روز	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۴۹	۱.۳.۴.۲	طبقه اول	۲۸ روز	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱.۷۶									
۵۰	۱.۳.۴.۲.۱	ستون / طبقه اول / اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱.۱۳									
۵۱	۱.۳.۴.۲.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها / طبقه اول / اسکلت	۶ روز	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۲	۱.۳.۴.۲.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه اول / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۳	۱.۳.۴.۲.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه اول / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۴	۱.۳.۴.۲.۲	سقف / طبقه اول / اسکلت	۱۴ روز	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰.۶۳									
۵۵	۱.۳.۴.۲.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله اول به دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۶	۱.۳.۴.۲.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه اول / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۰.۴۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۷	۱.۳.۴.۲.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه اول / اسکلت	۹ روز	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۰.۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۸	۱.۳.۴.۲.۲.۴	آرماتور بندی شمشیری پله اول به دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰.۰۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۵۹	۱.۳.۴.۲.۲.۵	جانمایی لوله های تاسیسات و ونت ها در سقف دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰.۰۳	اکیپ مکانیکال ۲ نفره								
۶۰	۱.۳.۴.۲.۲.۶	بتن ریزی سقف / طبقه اول / اسکلت	۱ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۶۱	۱.۳.۴.۳	طبقه دوم	۲۸ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱.۷۶									
۶۲	۱.۳.۴.۳.۱	ستون / طبقه دوم / اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱.۱۳									
۶۳	۱.۳.۴.۳.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها / طبقه دوم / اسکلت	۶ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۶۴	۱.۳.۴.۳.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه دوم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۶۵	۱.۳.۴.۳.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه دوم / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۶۶	۱.۳.۴.۳.۲	سقف / طبقه دوم / اسکلت	۱۴ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۰.۶۳									
۶۷	۱.۳.۴.۳.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله دوم به سوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۶۸	۱.۳.۴.۳.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه دوم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۰.۴۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۶۹	۱.۳.۴.۳.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه دوم / اسکلت	۹ روز	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۰.۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۷۰	۱.۳.۴.۳.۲.۴	آرماتور بندی شمشیری پله دوم به سوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۰.۰۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۷۱	۱.۳.۴.۳.۲.۵	جانمایی لوله های تاسیسات و ونت ها در سقف سوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۰.۰۳	اکیپ مکانیکال ۲ نفره								
۷۲	۱.۳.۴.۳.۲.۶	بتن ریزی سقف / طبقه دوم / اسکلت	۱ روز	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۷۳	۱.۳.۴.۴	طبقه سوم	۲۸ روز	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱.۷۶									
۷۴	۱.۳.۴.۴.۱	ستون / طبقه سوم / اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱.۱۳									
۷۵	۱.۳.۴.۴.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها / طبقه سوم / اسکلت	۶ روز	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۷۶	۱.۳.۴.۴.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه سوم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۷۷	۱.۳.۴.۴.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه سوم / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۷۸	۱.۳.۴.۴.۲	سقف / طبقه سوم / اسکلت	۱۴ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰.۶۳									

Project Planning Consultant: Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۹	Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1
۷۹	۱.۳.۴.۴.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله سوم به چهارم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۰	۱.۳.۴.۴.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه سوم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰.۴۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۱	۱.۳.۴.۴.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه سوم / اسکلت	۹ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰.۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۲	۱.۳.۴.۴.۲.۴	آرماتور بندی شمشیری پله سوم به چهارم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰.۰۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۳	۱.۳.۴.۴.۲.۵	جانمایی لوله های تاسیسات و ونت ها در سقف چهارم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰.۰۳	اکیپ مکانیکال ۲ نفره								
۸۴	۱.۳.۴.۴.۲.۶	بتن ریزی سقف / طبقه سوم / اسکلت	۱ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۵	۱.۳.۴.۵	طبقه چهارم	۲۸ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱.۷۶									
۸۶	۱.۳.۴.۵.۱	ستون / طبقه چهارم / اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱.۱۳									
۸۷	۱.۳.۴.۵.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها / طبقه چهارم / اسکلت	۶ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۸	۱.۳.۴.۵.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه چهارم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۸۹	۱.۳.۴.۵.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه چهارم / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۹۰	۱.۳.۴.۵.۲	سقف / طبقه چهارم / اسکلت	۱۴ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰.۶۳									
۹۱	۱.۳.۴.۵.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله چهارم به پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۹۲	۱.۳.۴.۵.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه چهارم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۰.۴۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۹۳	۱.۳.۴.۵.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه چهارم / اسکلت	۹ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰.۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۹۴	۱.۳.۴.۵.۲.۴	آرماتور بندی شمشیری پله چهارم به پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰.۰۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۹۵	۱.۳.۴.۵.۲.۵	جانمایی لوله های تاسیسات و ونت ها در سقف پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰.۰۳	اکیپ مکانیکال ۲ نفره								
۹۶	۱.۳.۴.۵.۲.۶	بتن ریزی سقف / طبقه چهارم / اسکلت	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۹۷	۱.۳.۴.۶	طبقه پنجم	۲۸ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱.۷۶									
۹۸	۱.۳.۴.۶.۱	ستون / طبقه پنجم / اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱.۱۳									
۹۹	۱.۳.۴.۶.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها / طبقه پنجم / اسکلت	۶ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۰	۱.۳.۴.۶.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه پنجم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۱	۱.۳.۴.۶.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه پنجم / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۲	۱.۳.۴.۶.۲	سقف / طبقه پنجم / اسکلت	۱۴ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰.۶۳									
۱۰۳	۱.۳.۴.۶.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله پنجم به ششم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۴	۱.۳.۴.۶.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه پنجم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰.۴۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۵	۱.۳.۴.۶.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه پنجم / اسکلت	۹ روز	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰.۱	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۶	۱.۳.۴.۶.۲.۴	آرماتور بندی شمشیری پله پنجم به ششم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰.۰۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۷	۱.۳.۴.۶.۲.۵	جانمایی لوله های تاسیسات و ونت ها در سقف ششم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰.۰۳	اکیپ مکانیکال ۲ نفره								
۱۰۸	۱.۳.۴.۶.۲.۶	بتن ریزی سقف / طبقه پنجم / اسکلت	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۰۹	۱.۳.۴.۷	طبقه ششم (بام و خرپشته)	۳۸ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱.۸۴									
۱۱۰	۱.۳.۴.۷.۱	ستون / طبقه ششم / اسکلت	۱۲ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱.۱۳									
۱۱۱	۱.۳.۴.۷.۱.۱	آرماتور بندی ستون ها / طبقه ششم / اسکلت	۶ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۰.۵	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۱۲	۱.۳.۴.۷.۱.۲	قالب بندی ستون ها / طبقه ششم / اسکلت	۵ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰.۳۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۱۳	۱.۳.۴.۷.۱.۳	بتن ریزی ستون ها / طبقه ششم / اسکلت	۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰.۲۶	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۱۴	۱.۳.۴.۷.۲	سقف / طبقه ششم / اسکلت	۲۴ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰.۷۲									
۱۱۵	۱.۳.۴.۷.۲.۱	قالب بندی شمشیری پله ششم به بام	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰.۰۳	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۱۶	۱.۳.۴.۷.۲.۲	قالب بندی سقف / طبقه ششم / اسکلت	۱۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰.۴۸	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								
۱۱۷	۱.۳.۴.۷.۲.۳	آرماتور بندی سقف / طبقه ششم / اسکلت	۱۳ روز	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰.۱۲	اکیپ اسکلت بتنی ۵ نفره								

Project Planning Consultant:
Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۱۳۹۹											
								Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1					
۱۵۷	۱.۴.۱.۲.۱۰	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۰.۰۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; pointer-events: none;"> اکیپ سنگ کاری ۲ نفره اکیپ نصب کاغذ دیواری ۲ نفره اکیپ شناسی کشتی سقف کا اکیپ رابیتس بندی سقف کا اکیپ نصب درب و چهارچوب اکیپ سنگ کاری ۲ اکیپ گچ کاری ۳ نفره اکیپ گچ کاری ۳ نفره اکیپ گچ کاری ۳ نفره اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره اکیپ نقاشی (سطوح چوبی) ۱ نفره اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره اکیپ کارهای چوبی تزئینی ۵ نفره </div>											
۱۵۸	۱.۴.۱.۲.۱۱	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه اول	۱ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۰.۰۲	اکیپ نصب کاغذ دیواری ۲ نفره												
۱۵۹	۱.۴.۱.۳	اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۳۴۳ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱.۲۵													
۱۶۰	۱.۴.۱.۳.۱	شاسی کشتی سقف کاذب / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۳ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰.۱	اکیپ شناسی کشتی سقف کاذب ۲ نفره												
۱۶۱	۱.۴.۱.۳.۲	رابیتس بندی سقف کاذب / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰.۰۳	اکیپ رابیتس بندی سقف کاذب ۱ نفره												
۱۶۲	۱.۴.۱.۳.۳	نصب چهارچوب درب فرانسوی / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰.۰۹	اکیپ نصب درب و چهارچوب ۲ نفره												
۱۶۳	۱.۴.۱.۳.۴	اجرای سرامیک کف / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۸ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰.۲۶	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۱۶۴	۱.۴.۱.۳.۵	گچ کاری آستر دیوار / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۴ روز	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰.۲	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۱۶۵	۱.۴.۱.۳.۶	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۴ روز	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۰.۲	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۱۶۶	۱.۴.۱.۳.۷	گچ کاری رویه دیوار / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۴ روز	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۰.۱۷	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۱۶۷	۱.۴.۱.۳.۸	اجرای کلاف چوبی / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۰.۰۵	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره												
۱۶۸	۱.۴.۱.۳.۹	اجرای نقاشی کلاف / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۰۳	اکیپ نقاشی (سطوح چوبی) ۱ نفره												
۱۶۹	۱.۴.۱.۳.۱۰	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۳ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۰.۰۹	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره												
۱۷۰	۱.۴.۱.۳.۱۱	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب هاو اتاق لباس / طبقه اول	۱ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۰.۰۲	اکیپ کارهای چوبی تزئینی ۵ نفره												
۱۷۱	۱.۴.۱.۴	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۲۷۵ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۰.۶۷													
۱۷۲	۱.۴.۱.۴.۱	شاسی کشتی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰.۰۵	اکیپ شناسی کشتی سقف کا												
۱۷۳	۱.۴.۱.۴.۲	شیب بندی کف / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰.۰۳	اکیپ بنایی ۲ نفره												
۱۷۴	۱.۴.۱.۴.۳	ایزولاسیون کف / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰.۰۳	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره												
۱۷۵	۱.۴.۱.۴.۴	ایزولاسیون دیواره / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰.۰۵	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره												
۱۷۶	۱.۴.۱.۴.۵	اجرای اندود محافظ عایق / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره												
۱۷۷	۱.۴.۱.۴.۶	اجرای کاشی زیرکابینتی / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰.۰۷	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۱۷۸	۱.۴.۱.۴.۷	اجرای سرامیک کف / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۳ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۰.۱	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۱۷۹	۱.۴.۱.۴.۸	نصب کفشوی / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۵ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰.۱۷	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره												
۱۸۰	۱.۴.۱.۴.۹	رابیتس بندی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰.۰۲	اکیپ رابیتس بندی سقف کاذب ۱ نفره												
۱۸۱	۱.۴.۱.۴.۱۰	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۲ روز	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۰.۰۷	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۱۸۲	۱.۴.۱.۴.۱۱	نصب کابینت و تجهیزات آشپزخانه / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۰ روز	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۰	اکیپ نصب کابینت ۲ نفره												
۱۸۳	۱.۴.۱.۴.۱۲	اجرای کاشی بین کابینتی / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه اول	۲ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۰.۰۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۱۸۴	۱.۴.۱.۵	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۲۷ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱.۱۶													
۱۸۵	۱.۴.۱.۵.۱	نصب چهارچوب درب فرانسوی / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰.۰۹	اکیپ نصب درب و چهارچوب ۲ نفره												
۱۸۶	۱.۴.۱.۵.۲	شیب بندی کف / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰.۰۳	اکیپ بنایی ۲ نفره												
۱۸۷	۱.۴.۱.۵.۳	ایزولاسیون کف / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۰.۰۲	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره												
۱۸۸	۱.۴.۱.۵.۴	اجرای اندود محافظ عایق / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره												
۱۸۹	۱.۴.۱.۵.۵	اجرای سرامیک دیوار / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۹ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰.۲۹	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۱۹۰	۱.۴.۱.۵.۶	اجرای سرامیک کف / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۳ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰.۰۹	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۱۹۱	۱.۴.۱.۵.۷	نصب کفشوی / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۶ روز	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰.۲	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره												
۱۹۲	۱.۴.۱.۵.۸	نصب تجهیزات بهداشتی / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۴ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰.۱۲	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره												
۱۹۳	۱.۴.۱.۵.۹	اجرای زیر سازی سقف کاذب حمام / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰.۰۳	اکیپ شناسی کشتی سقف کاذب ۲ نفره												
۱۹۴	۱.۴.۱.۵.۱۰	اجرای باکس PVC حمام / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۵ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰.۱۵	اکیپ کارهای پی وی سی ۲ نفره												
۱۹۵	۱.۴.۱.۵.۱۱	نصب پنل آسمان مجازی حمام / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰.۰۷	اکیپ شناسی کشتی سقف کاذب ۲ نفره												

Project Planning Consultant: Farhad Jalali-09124851030	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
	Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۱۳۹۹														
								Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1								
۱۹۶	۱.۴.۱.۵.۱۲	شاسی کشتی کتاف دستشویی / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰.۰۲	اکیپ کتاف کار ۲ نفره	<div style="position: absolute; top: 20px; left: 20px;"> <p>اکیپ کتاف کار ۲ نفره</p> <p>اکیپ کتاف کار ۲ نفره</p> <p>اکیپ نقاشی ۲ نفره</p> <p>اکیپ بنايي ۲ نفره</p> <p>اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره</p> <p>اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره</p> <p>اکیپ بنايي ۲ نفره</p> <p>اکیپ سنگ کاری ۲ نفره</p> <p>اکیپ سنگ کاری ۲ نفره</p> <p>اکیپ سنگ کاری ۲ نفره</p> <p>اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره</p> <p>اکیپ سنگ کاری ۲ نفره</p> <p>اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره</p> <p>اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره</p> </div>														
۱۹۷	۱.۴.۱.۵.۱۳	اجرای پنل کتاف دستشویی / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰.۰۲	اکیپ کتاف کار ۲ نفره															
۱۹۸	۱.۴.۱.۵.۱۴	نقاشی رنگ پلاستیک دستشویی / سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰.۰۲	اکیپ نقاشی ۲ نفره															
۱۹۹	۱.۴.۱.۶	بالکن و لاندري / طبقه اول	۱۹۳ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱.۰۸																
۲۰۰	۱.۴.۱.۶.۱	شيب بndی کف / بالکن و لاندري / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰.۰۳	اکیپ بنايي ۲ نفره															
۲۰۱	۱.۴.۱.۶.۲	ایزولاسیون کف / بالکن و لاندري / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰.۰۲	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره															
۲۰۲	۱.۴.۱.۶.۳	ایزولاسیون دیواره / بالکن و لاندري / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰.۰۵	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره															
۲۰۳	۱.۴.۱.۶.۴	اجرای انود محافظ عایق / بالکن و لاندري / طبقه اول	۱ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۰.۰۲	اکیپ بنايي ۲ نفره															
۲۰۴	۱.۴.۱.۶.۵	اجرای سنگ تراورتن نما اصلی / بالکن و لاندري / طبقه اول	۴ روز	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰.۱۴	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره															
۲۰۵	۱.۴.۱.۶.۶	اجرای سرامیک کف تراس پشتی / بالکن و لاندري / طبقه اول	۵ روز	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰.۱۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره															
۲۰۶	۱.۴.۱.۶.۷	اجرای سنگ تراورتن دیوار تراس پشتی / بالکن و لاندري / طبقه اول	۴ روز	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰.۱۲	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره															
۲۰۷	۱.۴.۱.۶.۸	نصب کفشوی / بالکن و لاندري / طبقه اول	۲ روز	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰.۰۷	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره															
۲۰۸	۱.۴.۱.۶.۹	نصب هندیل / بالکن و لاندري / طبقه اول	۵ روز	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰.۱۷	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره															
۲۰۹	۱.۴.۱.۶.۱۰	اجرای پنل چوب نراد تراس پشتی / بالکن و لاندري / طبقه اول	۳ روز	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰.۱	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره															
۲۱۰	۱.۴.۱.۶.۱۱	اجرای سیلر کیلر تراس پشتی / بالکن و لاندري / طبقه اول	۶ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰.۲	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره															
۲۱۱	۱.۴.۲	طبقه دوم	۳۸۰ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹.۰۵																
۲۱۲	۱.۴.۲.۱	کارهای عمومی / طبقه دوم	۳۸۰ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳.۳۵																
۲۱۳	۱.۴.۲.۱.۱	نصب وال پست / کارهای عمومی / طبقه دوم	۶ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰.۲	اکیپ جوشکاری ۲ نفره															
۲۱۴	۱.۴.۲.۱.۲	یک رگه چینی / کارهای عمومی / طبقه دوم	۵ روز	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰.۲۲	اکیپ یک رگه چینی ۳ نفره															
۲۱۵	۱.۴.۲.۱.۳	ایزوگام دورچین و تیر / وال پست و ستون / کارهای عمومی / طبقه دوم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰.۰۷	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره															
۲۱۶	۱.۴.۲.۱.۴	تیغه چینی / کارهای عمومی / طبقه دوم	۲۴ روز	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۰.۷۷	اکیپ تیغه چینی ۲ نفره															
۲۱۷	۱.۴.۲.۱.۵	لوله کشتی فاضلاب / کارهای عمومی / طبقه دوم	۶ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۰.۲	اکیپ پوش فیت کار ۲ نفره															
۲۱۸	۱.۴.۲.۱.۶	لوله کشتی آب سرد و گرم / کارهای عمومی / طبقه دوم	۷ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰.۲۲	اکیپ پنج لایه کار ۲ نفره															
۲۱۹	۱.۴.۲.۱.۷	اجرای زیر ساخت و لوله کشتی اسپیلیت / کارهای عمومی / طبقه دوم	۴ روز	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰.۱	اکیپ مکانیکال ۲ نفره															
۲۲۰	۱.۴.۲.۱.۸	اجرای زیر ساخت رادیاتور / کارهای عمومی / طبقه دوم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰.۰۹	اکیپ رادیاتور ۲ نفره															
۲۲۱	۱.۴.۲.۱.۹	اجرای زیر ساخت جارو برقی مرکزی / کارهای عمومی / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰.۰۲	اکیپ نصب جاروبرقی مرکزی ۲ نفره															
۲۲۲	۱.۴.۲.۱.۱۰	لوله کشتی گاز / کارهای عمومی / طبقه دوم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰.۱	اکیپ لوله کشتی گاز ۲ نفره															
۲۲۳	۱.۴.۲.۱.۱۱	لوله گذاری سیستم BMS / کارهای عمومی / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰.۰۹	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره															
۲۲۴	۱.۴.۲.۱.۱۲	اجرای فوم بتن / کارهای عمومی / طبقه دوم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۰.۱۴	اکیپ اجرای فوم بتن ۴ نفره															
۲۲۵	۱.۴.۲.۱.۱۳	نصب قوطی و لوله گذاری الکتریکی دیوارسقف / کارهای عمومی / طبقه دوم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰.۰۷	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره															
۲۲۶	۱.۴.۲.۱.۱۴	نصب چهارچوب درب ضد سرقت / کارهای عمومی / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰.۰۲	اکیپ نصب درب چوبی ۲ نفره															
۲۲۷	۱.۴.۲.۱.۱۵	نصب درب ضد سرقت / کارهای عمومی / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰.۰۲	اکیپ نصب درب ضد سرقت ۲ نفره															
۲۲۸	۱.۴.۲.۱.۱۶	نصب تابلو برق / کارهای عمومی / طبقه دوم	۴ روز	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰.۱۴	اکیپ نصب تابلو برق ۲ نفره															
۲۲۹	۱.۴.۲.۱.۱۷	سیم کشتی / کارهای عمومی / طبقه دوم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۰.۱	اکیپ سیم کشتی ۲ نفره															
۲۳۰	۱.۴.۲.۱.۱۸	نصب پنجره / کارهای عمومی / طبقه دوم	۷ روز	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۰.۱۹	اکیپ نصب پنجره یو پی وی سی ۲ نفره															
۲۳۱	۱.۴.۲.۱.۱۹	نصب درب چوبی و یراق آلات / کارهای عمومی / طبقه دوم	۶ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۰.۲	اکیپ نقاشی و نصب یراق آلات ۲ نفره															
۲۳۲	۱.۴.۲.۱.۲۰	نصب تجهیزات روشنایی / کارهای عمومی / طبقه دوم	۵ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۰.۱۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره															
۲۳۳	۱.۴.۲.۱.۲۱	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / کارهای عمومی / طبقه دوم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۰.۱	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره															
۲۳۴	۱.۴.۲.۱.۲۲	نصب تجهیزات اعلام حریق / کارهای عمومی / طبقه دوم	۳ روز	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۰.۰۷	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره															

Project Planning Consultant: Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۱۳۹۹												
								Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1						
۲۳۵	۱.۴.۲.۱.۲۳	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه دوم	۳ روز	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۰.۱	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره												
۲۳۶	۱.۴.۲.۲	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۳۳۳ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱.۵۵		اکیپ شاسی کثی سقف کاذب												
۲۳۷	۱.۴.۲.۲.۱	شاسی کثی سقف کاذب / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۵ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰.۱۷	اکیپ شاسی کثی سقف کاذب ۲ نفره	اکیپ شاسی کثی سقف کاذب												
۲۳۸	۱.۴.۲.۲.۲	رایبتس بندی سقف کاذب / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰.۰۵	اکیپ رایبتس بندی سقف کاذب ۱ نفره	اکیپ رایبتس بندی سقف کاذب												
۲۳۹	۱.۴.۲.۲.۳	اجرای سرامیک کف / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۱۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰.۴۱	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۲۴۰	۱.۴.۲.۲.۴	گچ کاری آستر دیوار / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۵ روز	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰.۲	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۴۱	۱.۴.۲.۲.۵	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۷ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۰.۳۱	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۴۲	۱.۴.۲.۲.۶	گچ کاری رویه دیوار / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۰.۱۷	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۴۳	۱.۴.۲.۲.۷	اجرای کلاف چوبی / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۰/۰.۵	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره												
۲۴۴	۱.۴.۲.۲.۸	اجرای نقاشی کلاف / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۰/۰.۳	اکیپ نقاشی (سطوح چوبی) ۱ نفره	اکیپ نقاشی (سطوح چوبی) ۱ نفره												
۲۴۵	۱.۴.۲.۲.۹	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰.۰۹	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره												
۲۴۶	۱.۴.۲.۲.۱۰	نصب قرنیز PVC / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۰.۰۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۲۴۷	۱.۴.۲.۲.۱۱	اجرای کاغذ دیواری یکی از دیوار ها / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه دوم	۱ روز	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۰.۰۲	اکیپ نصب کاغذ دیواری ۲ نفره	اکیپ نصب کاغذ دیواری ۲ نفره												
۲۴۸	۱.۴.۲.۳	اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۳۲۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱.۲۵		اکیپ شاسی کثی سقف کاذب												
۲۴۹	۱.۴.۲.۳.۱	شاسی کثی سقف کاذب / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۴ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰.۱	اکیپ شاسی کثی سقف کاذب ۲ نفره	اکیپ شاسی کثی سقف کاذب												
۲۵۰	۱.۴.۲.۳.۲	رایبتس بندی سقف کاذب / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰.۰۳	اکیپ رایبتس بندی سقف کاذب ۱ نفره	اکیپ رایبتس بندی سقف کاذب												
۲۵۱	۱.۴.۲.۳.۳	نصب چهارچوب درب فرانسوی / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰.۰۹	اکیپ نصب درب و چهارچوب ۲ نفره	اکیپ نصب درب و چهارچوب ۲ نفره												
۲۵۲	۱.۴.۲.۳.۴	اجرای سرامیک کف / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۸ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰.۲۶	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۲۵۳	۱.۴.۲.۳.۵	گچ کاری آستر دیوار / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۴ روز	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰.۲	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۵۴	۱.۴.۲.۳.۶	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۰.۲	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۵۵	۱.۴.۲.۳.۷	گچ کاری رویه دیوار / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۰.۱۷	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۵۶	۱.۴.۲.۳.۸	اجرای کلاف چوبی / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۰/۰.۵	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره												
۲۵۷	۱.۴.۲.۳.۹	اجرای نقاشی کلاف / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۰/۰.۳	اکیپ نقاشی (سطوح چوبی) ۱ نفره	اکیپ نقاشی (سطوح چوبی) ۱ نفره												
۲۵۸	۱.۴.۲.۳.۱۰	اجرای درب و طبقه کمد با MDF / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۳ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰.۰۹	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره	اکیپ کارهای چوبی ۲ نفره												
۲۵۹	۱.۴.۲.۳.۱۱	اجرای قرنیز PVC / اتاق خواب ها و اتاق لباس / طبقه دوم	۱ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۰.۰۲	اکیپ کارهای چوبی تزئینی ۵ نفره	اکیپ کارهای چوبی تزئینی ۵ نفره												
۲۶۰	۱.۴.۲.۴	آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۲۵۸ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰.۶۷		اکیپ شاسی کثی سقف کاذب												
۲۶۱	۱.۴.۲.۴.۱	شاسی کثی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۰.۰۵	اکیپ شاسی کثی سقف کاذب ۲ نفره	اکیپ شاسی کثی سقف کاذب												
۲۶۲	۱.۴.۲.۴.۲	شیب بندی کف / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۰.۰۳	اکیپ بنایی ۲ نفره	اکیپ بنایی ۲ نفره												
۲۶۳	۱.۴.۲.۴.۳	ایزولاسیون کف / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۰.۰۳	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره												
۲۶۴	۱.۴.۲.۴.۴	ایزولاسیون دیواره / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۰.۰۵	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره												
۲۶۵	۱.۴.۲.۴.۵	اجرای اندود محافظ عایق / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره	اکیپ بنایی ۲ نفره												
۲۶۶	۱.۴.۲.۴.۶	اجرای کاشی زیرکابینتی / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰.۰۷	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۲۶۷	۱.۴.۲.۴.۷	اجرای سرامیک کف / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰.۱	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۲۶۸	۱.۴.۲.۴.۸	نصب کفشوی / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۵ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰.۱۷	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره												
۲۶۹	۱.۴.۲.۴.۹	رایبتس بندی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰.۰۲	اکیپ رایبتس بندی سقف کاذب ۱ نفره	اکیپ رایبتس بندی سقف کاذب ۱ نفره												
۲۷۰	۱.۴.۲.۴.۱۰	گچ کاری و اجرای ابزار گچی سقف کاذب / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۲ روز	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰.۰۷	اکیپ گچ کاری ۳ نفره	اکیپ گچ کاری ۳ نفره												
۲۷۱	۱.۴.۲.۴.۱۱	نصب کابینت و تجهیزات آشپزخانه / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۰ روز	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰	اکیپ نصب کابینت ۲ نفره	01/22												
۲۷۲	۱.۴.۲.۴.۱۲	اجرای کاشی بین کابینتی / آشپزخانه و صبحانه خوری / طبقه دوم	۱ روز	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰.۰۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												
۲۷۳	۱.۴.۲.۵	سرویس های بهداشتی و حمام ها / طبقه دوم	۲۶ روز	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱.۱۶		اکیپ سنگ کاری ۲ نفره												

Project Planning Consultant:
Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۹
F۶۹	۱.۴.۴.۶.۳	ایزولاسیون دیواره / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰.۰۵	اکیب ایزولاسیون ۲ نفره	Q3
F۷۰	۱.۴.۴.۶.۴	اجرای اندود محافظ عایق / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰.۰۲	اکیب بنایی ۲ نفره	Q4
F۷۱	۱.۴.۴.۶.۵	اجرای سنگ تراورتن نما اصلی / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۶ روز	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰.۱۴	اکیب سنگ کاری ۲ نفره	Q1
F۷۲	۱.۴.۴.۶.۶	اجرای سرامیک کف تراس پشتی / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۶ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰.۱۵	اکیب سنگ کاری ۲ نفره	Q2
F۷۳	۱.۴.۴.۶.۷	اجرای سنگ تراورتن دیوار تراس پشتی / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۴ روز	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰.۱۲	اکیب سنگ کاری ۲ نفره	Q2
F۷۴	۱.۴.۴.۶.۸	نصب کفشی / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۳ روز	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰.۰۷	اکیب نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	Q2
F۷۵	۱.۴.۴.۶.۹	نصب هندیل / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۶ روز	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۰.۱۷	اکیب سنگ کاری ۲ نفره	Q2
F۷۶	۱.۴.۴.۶.۱۰	اجرای پنل چوب نراد تراس پشتی / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۵ روز	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۰.۱	اکیب کارهای چوبی ۲ نفره	Q2
F۷۷	۱.۴.۴.۶.۱۱	اجرای سیلر کیلر تراس پشتی / بالکن و لاندری / طبقه چهارم	۹ روز	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰.۲	اکیب کارهای چوبی ۲ نفره	Q2
F۷۸	۱.۴.۵	طبقه پنجم	۳۲۰ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۹.۰۵		Q2
F۷۹	۱.۴.۵.۱	کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳۲۰ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۳.۳۵		Q2
F۸۰	۱.۴.۵.۱.۱	نصب وال پست / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۶ روز	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰.۲	اکیب جوشکاری ۲ نفره	Q2
F۸۱	۱.۴.۵.۱.۲	یک رگه چینی / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۵ روز	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰.۲۲	اکیب یک رگه چینی ۳ نفره	Q2
F۸۲	۱.۴.۵.۱.۳	ایزوگام دورچین و تیر / وال پست و ستون / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۲ روز	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰.۰۷	اکیب ایزولاسیون ۲ نفره	Q2
F۸۳	۱.۴.۵.۱.۴	تیغه چینی / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۲۴ روز	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰.۷۷	اکیب تیغه چینی ۲ نفره	Q2
F۸۴	۱.۴.۵.۱.۵	لوله کشی فاضلاب / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۶ روز	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰.۲	اکیب پوش فیت کار ۲ نفره	Q2
F۸۵	۱.۴.۵.۱.۶	لوله کشی آب سرد و گرم / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۷ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰.۲۲	اکیب پنج لایه کار ۲ نفره	Q2
F۸۶	۱.۴.۵.۱.۷	اجرای زیر ساخت و لوله کشی اسپیلیت / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۴ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰.۱	اکیب مکانیکال ۲ نفره	Q2
F۸۷	۱.۴.۵.۱.۸	اجرای زیر ساخت رادیاتور / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰.۰۹	اکیب رادیاتور ۲ نفره	Q2
F۸۸	۱.۴.۵.۱.۹	اجرای زیر ساخت جارو برقی مرکزی / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰.۰۲	اکیب نصب جاروبرقی مرکزی ۲ نفره	Q2
F۸۹	۱.۴.۵.۱.۱۰	لوله کشی گاز / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰.۱	اکیب لوله کشی گاز ۲ نفره	Q2
F۹۰	۱.۴.۵.۱.۱۱	لوله گذاری سیستم BMS / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰.۰۹	اکیب لوله گذاری الکتریکال ۲ نفره	Q2
F۹۱	۱.۴.۵.۱.۱۲	اجرای فوم بتن / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰.۱۴	اکیب اجرای فوم بتن ۴ نفره	Q2
F۹۲	۱.۴.۵.۱.۱۳	نصب قوطی و لوله گذاری الکتریکال دیوارسقف / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰.۰۷	اکیب لوله گذاری الکتریکال ۲ نفره	Q2
F۹۳	۱.۴.۵.۱.۱۴	نصب چهارچوب درب ضد سرقت / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰.۰۲	اکیب نصب درب چوبی ۲ نفره	Q2
F۹۴	۱.۴.۵.۱.۱۵	نصب درب ضد سرقت / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۱ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰.۰۲	اکیب نصب درب ضد سرقت ۲ نفره	Q2
F۹۵	۱.۴.۵.۱.۱۶	نصب تابلو برق / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۴ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰.۱۴	اکیب نصب تابلو برق ۲ نفره	Q2
F۹۶	۱.۴.۵.۱.۱۷	سیم کشی / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۰.۱	اکیب سیم کشی ۲ نفره	Q2
F۹۷	۱.۴.۵.۱.۱۸	نصب پنجره / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۷ روز	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۰.۱۹	اکیب نصب پنجره یو پی وی سی ۲ نفره	Q2
F۹۸	۱.۴.۵.۱.۱۹	نصب درب چوبی و یراق آلات / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۶ روز	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۰.۲	اکیب نقاشی و نصب یراق آلات ۲ نفره	Q2
F۹۹	۱.۴.۵.۱.۲۰	نصب تجهیزات روشنایی / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۵ روز	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۰.۱۲	اکیب نصب تجهیزات الکتریکال ۲ نفره	Q2
۵۰۰	۱.۴.۵.۱.۲۱	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۴ روز	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۰.۱	اکیب نصب تجهیزات الکتریکال ۲ نفره	Q2
۵۰۱	۱.۴.۵.۱.۲۲	نصب تجهیزات اعلام حریق / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۰.۰۷	اکیب نصب تجهیزات الکتریکال ۲ نفره	Q2
۵۰۲	۱.۴.۵.۱.۲۳	نصب شیرآلات / کارهای عمومی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۰.۱	اکیب نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	Q2
۵۰۳	۱.۴.۵.۲	ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۲۷۳ روز	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱.۵۵		Q2
۵۰۴	۱.۴.۵.۲.۱	شاسی کشی سقف کاذب / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۵ روز	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰.۱۷	اکیب شاسی کشی سقف کاذب ۲ نفره	Q2
۵۰۵	۱.۴.۵.۲.۲	رایتس بندی سقف کاذب / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۳ روز	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰.۰۵	اکیب رایتس بندی سقف کاذب ۱ نفره	Q2
۵۰۶	۱.۴.۵.۲.۳	اجرای سرامیک کف / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۱۳ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰.۴۱	اکیب سنگ کاری ۲ نفره	Q2
۵۰۷	۱.۴.۵.۲.۴	گچ کاری آستر دیوار / ورودی، نشیمن و هال ارتباطی / طبقه پنجم	۵ روز	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰.۲	اکیب گچ کاری ۳ نفره	Q2

Project Planning Consultant:
Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۱۳۹۹							
								Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1	
V۴۲	۱.۶.۱۳	نصب نرده سنگی راه پله / راه پله ها	۵ روز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۰.۱۷	اکیپ جوشکاری ۲ نفره								
V۴۳	۱.۶.۱۴	نصب تجهیزات روشنایی / راه پله ها	۵ روز	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۰.۱۵	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
V۴۴	۱.۶.۱۵	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / راه پله ها	۵ روز	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۰.۱۵	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
V۴۵	۱.۶.۱۶	ساب سنگ کف / راه پله ها	۴ روز	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۰.۰۷	اکیپ ساب زن ۱ نفره								
V۴۶	۱.۶.۱۷	نصب شیلنگ اطفا حریق / راه پله ها	۳ روز	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰.۰۹	اکیپ نصب تجهیزات اطفا حریق ۲ نفره								
V۴۷	۱.۶.۱۸	نصب تجهیزات اعلام حریق / راه پله ها	۳ روز	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۰.۰۹	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
V۴۸	۱.۷	نورگیر	۷ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰.۲۹									
V۴۹	۱.۷.۱	سیمان کاری آستر دیوار / نورگیر	۴ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰.۱۷	اکیپ سیمان کاری ۳ نفره								
V۵۰	۱.۷.۲	سیمان کاری رویه دیوار / نورگیر	۳ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰.۱۲	اکیپ سیمان کاری ۳ نفره								
V۵۱	۱.۸	بام و خرپشته	۱۷۲ روز	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۷.۸۲									
V۵۲	۱.۸.۱	بام	۱۷۲ روز	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۵.۷۷									
V۵۳	۱.۸.۱.۱	نصب وال پست / بام	۶ روز	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰.۲	اکیپ جوشکاری ۲ نفره								
V۵۴	۱.۸.۱.۲	یک رگه چینی / بام	۵ روز	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰.۲۴	اکیپ یک رگه چینی ۳ نفره								
V۵۵	۱.۸.۱.۳	ایزوگام دورچین و تیر / وال پست و ستون / بام	۲ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰.۰۷	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره								
V۵۶	۱.۸.۱.۴	تیغه چینی / بام	۲۴ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰.۸۲	اکیپ تیغه چینی ۲ نفره								
V۵۷	۱.۸.۱.۵	شاسی کشی فلزی آلچیق / بام	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰.۰۳	اکیپ جوشکاری ۲ نفره								
V۵۸	۱.۸.۱.۶	رایتس بندی آلچیق / بام	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰.۰۲	اکیپ رایتس بندی ۲ نفره								
V۵۹	۱.۸.۱.۷	لوله کشی فاضلاب / بام	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰.۰۳	اکیپ پوش فیت کار ۲ نفره								
V۶۰	۱.۸.۱.۸	لوله کشی آب سرد / بام	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰.۰۳	اکیپ پنج لایه کار ۲ نفره								
V۶۱	۱.۸.۱.۹	نصب قوطی و لوله گذاری الکتریکی در دیوار / بام	۴ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰.۱۲	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره								
V۶۲	۱.۸.۱.۱۰	پوکه ریزی و شیب بندی کف / بام	۷ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰.۲۴	اکیپ بنایی ۲ نفره								
V۶۳	۱.۸.۱.۱۱	نصب چهارچوب درب فلزی / بام	۴ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰.۱۴	اکیپ بنایی ۲ نفره								
V۶۴	۱.۸.۱.۱۲	ایزولاسیون کف / بام	۸ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰.۲۶	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره								
V۶۵	۱.۸.۱.۱۳	ایزولاسیون دیواره / بام	۶ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰.۲	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره								
V۶۶	۱.۸.۱.۱۴	اجرای اندود محافظ عایق / بام	۵ روز	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰.۱۵	اکیپ بنایی ۲ نفره								
V۶۷	۱.۸.۱.۱۵	اجرای سنگ بدنه و قرنیز سنگی / بام	۲۸ روز	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰.۹۴	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره								
V۶۸	۱.۸.۱.۱۶	اجرای آلچیق تمام سنگ / بام	۱۵ روز	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰.۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره								
V۶۹	۱.۸.۱.۱۷	اجرای سنگ کف / بام	۲۴ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰.۸	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره								
V۷۰	۱.۸.۱.۱۸	نصب کفشی / بام	۳ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰.۱	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره								
V۷۱	۱.۸.۱.۱۹	سیم کشی / بام	۳ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰.۱	اکیپ سیم کشی ۲ نفره								
V۷۲	۱.۸.۱.۲۰	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / بام	۴ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۰.۱۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
V۷۳	۱.۸.۱.۲۱	نصب تجهیزات روشنایی / بام	۵ روز	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۰.۱۵	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
V۷۴	۱.۸.۱.۲۲	نصب اگزاست فن / بام	۲ روز	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۰.۱	اکیپ نصب اگزاست فن ۳ نفره								
V۷۵	۱.۸.۱.۲۳	نصب پنجره / بام	۲ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۰.۰۷	اکیپ نصب پنجره یو پی وی سی ۲ نفره								
V۷۶	۱.۸.۱.۲۴	اجرای بارکیو / بام	۸ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۰.۲۷	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره								
V۷۷	۱.۸.۱.۲۵	نصب شیرآلات / بام	۱ روز	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره								
V۷۸	۱.۸.۱.۲۶	نصب و نقاشی درب فلزی و یراق آلات / بام	۲ روز	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۰.۰۳	اکیپ نقاشی ۱ نفره								
V۷۹	۱.۸.۲	خرپشته	۱۳۷ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱.۳۱									
V۸۰	۱.۸.۲.۱	یک رگه چینی / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰.۲۴	اکیپ یک رگه چینی ۳ نفره								

Project Planning Consultant:
Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱


ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	9
۷۸۱	۱.۸.۲.۲	تیغه چینی / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰.۸۲	اکیپ تیغه چینی ۲ نفره	Q3
۷۸۲	۱.۸.۲.۳	پوکه ریزی و شیب بندی کف / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره	Q3
۷۸۳	۱.۸.۲.۴	ایزولاسیون کف / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰.۰۳	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره	Q4
۷۸۴	۱.۸.۲.۵	اجرای اندود محافظ عایق / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره	Q4
۷۸۵	۱.۸.۲.۶	اجرای سنگ کف / خرپشته	۲ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰.۰۷	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q1
۷۸۶	۱.۸.۲.۷	اجرای نرده سنگی / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰.۰۵	اکیپ سنگ کاری ۴ نفره	Q1
۷۸۷	۱.۸.۲.۸	اجرای نشیمن سنگی / خرپشته	۲ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰.۰۵	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q1
۷۸۸	۱.۸.۲.۹	اجرای راه پله سنگی / خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰.۰۲	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q1
۷۸۹	۱.۸.۳	سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۵۸ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰.۴۱		Q2
۷۹۰	۱.۸.۳.۱	شیب بندی کف / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره	Q2
۷۹۱	۱.۸.۳.۲	ایزولاسیون کف / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰.۰۲	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره	Q2
۷۹۲	۱.۸.۳.۳	اجرای اندود محافظ عایق / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰.۰۲	اکیپ بنایی ۲ نفره	Q2
۷۹۳	۱.۸.۳.۴	نصب قوطی و لوله گذاری الکتریکی در دیوار و سقف / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰.۰۲	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره	Q2
۷۹۴	۱.۸.۳.۵	اجرای سرامیک دیوار / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۴ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰.۱۲	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q2
۷۹۵	۱.۸.۳.۶	اجرای سرامیک کف / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰.۰۳	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q2
۷۹۶	۱.۸.۳.۷	نصب کفشوی / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰.۰۳	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	Q2
۷۹۷	۱.۸.۳.۸	نصب تجهیزات بهداشتی / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰.۰۳	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	Q2
۷۹۸	۱.۸.۳.۹	نصب تجهیزات روشنایی / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره	Q2
۷۹۹	۱.۸.۳.۱۰	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره	Q2
۸۰۰	۱.۸.۳.۱۱	شاسی کشی سقف کاذب / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰.۰۲	اکیپ کثاف کار ۲ نفره	Q2
۸۰۱	۱.۸.۳.۱۲	اجرای پنل کثاف دستشویی / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰.۰۲	اکیپ کثاف کار ۲ نفره	Q2
۸۰۲	۱.۸.۳.۱۳	نصب شیرآلات / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات بهداشتی ۲ نفره	Q2
۸۰۳	۱.۸.۳.۱۴	نصب درب چوبی و یراق آلات / سرویس بهداشتی / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰.۰۳	اکیپ نقاشی و نصب یراق آلات ۲ نفره	Q2
۸۰۴	۱.۸.۴	انباری ها / بام و خرپشته	۶۵ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰.۳۲		Q2
۸۰۵	۱.۸.۴.۱	نصب قوطی کلید و پریز و لوله گذاری الکتریکی کف و دیوار / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰.۰۲	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره	Q2
۸۰۶	۱.۸.۴.۲	پوکه ریزی و شیب بندی کف / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰.۰۳	اکیپ بنایی ۲ نفره	Q2
۸۰۷	۱.۸.۴.۳	اجرای سنگ کف / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰.۰۳	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q2
۸۰۸	۱.۸.۴.۴	اجرای سنگ دیوار / انباری ها / بام و خرپشته	۴ روز	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰.۱۲	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره	Q2
۸۰۹	۱.۸.۴.۵	سیم کشی / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰.۰۲	اکیپ سیم کشی ۲ نفره	Q2
۸۱۰	۱.۸.۴.۶	شاسی کشی سقف کاذب پی وی سی / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰.۰۲	اکیپ شاسی کشی سقف کاذب ۲ نفره	Q2
۸۱۱	۱.۸.۴.۷	اجرای تایل پی وی سی سقف / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰.۰۲	اکیپ نصب دیوار پوش ۲ نفره	Q2
۸۱۲	۱.۸.۴.۸	نصب تجهیزات روشنایی / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره	Q2
۸۱۳	۱.۸.۴.۹	نصب تجهیزات الکتریکی دیوار-کلید و پریز / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره	Q2
۸۱۴	۱.۸.۴.۱۰	نصب درب چوبی و یراق آلات / انباری ها / بام و خرپشته	۱ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰.۰۳	اکیپ نقاشی و نصب یراق آلات ۲ نفره	Q2
۸۱۵	۱.۹	آسانسور	۸۹ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۳.۹۳		Q2
۸۱۶	۱.۹.۱	چاله و داکت آسانسور	۳۹ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱.۴۲		Q2
۸۱۷	۱.۹.۱.۱	سیمان کاری آستر دیوار و سقف / چاله و داکت آسانسور	۹ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰.۴۳	اکیپ سیمان کاری ۳ نفره	Q2
۸۱۸	۱.۹.۱.۲	اجرای کلاف آسانسور / چاله و داکت آسانسور	۲۸ روز	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰.۹۶	اکیپ جوشکاری ۲ نفره	Q2
۸۱۹	۱.۹.۱.۳	لوله گذاری الکتریکی و سیم کشی / چاله و داکت آسانسور	۱ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰.۰۲	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره	Q2

Project Planning Consultant:
Farhad Jalali-09124851030

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

برنامه زمان بندی مصوب پروژه مجتمع مسکونی لوکس هوتن ۷۱

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	w.f	Resource Names	۹	Q3	Q4	Q1	Q2	Q2	Q4	Q1
۸۲۰	۱.۹.۱.۴	نصب تجهیزات روشنایی / چاله و داکت آسانسور	۱ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰.۰۲	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
۸۲۱	۱.۹.۲	آسانسور	۵۰ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۲.۵۱									
۸۲۲	۱.۹.۲.۱	ریل گذاری آسانسور / آسانسور	۱۰ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۰.۴۸	اکیپ نصب و راه اندازی آسانسور ۳ نفره								
۸۲۳	۱.۹.۲.۲	نصب فریم درب آسانسور / آسانسور	۷ روز	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۰.۳۶	اکیپ نصب و راه اندازی آسانسور ۳ نفره								
۸۲۴	۱.۹.۲.۳	نصب تجهیزات الکترومکانیکال آسانسور / آسانسور	۱۰ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۰.۵۱	اکیپ نصب و راه اندازی آسانسور ۳ نفره								
۸۲۵	۱.۹.۲.۴	نصب کابین آسانسور / آسانسور	۸ روز	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۰.۴۱	اکیپ نصب و راه اندازی آسانسور ۳ نفره								
۸۲۶	۱.۹.۲.۵	نصب درب آسانسور / آسانسور	۱۴ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۰.۷۲	اکیپ نصب و راه اندازی آسانسور ۳ نفره								
۸۲۷	۱.۹.۲.۶	راه اندازی آسانسور / آسانسور	۱ روز	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۰.۰۳	اکیپ نصب و راه اندازی آسانسور ۳ نفره								
۸۲۸	۱.۱۰	نما	۱۸۴ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۷.۹۹									
۸۲۹	۱.۱۰.۱	نمای اصلی / نما	۱۶۰ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۶.۴۴									
۸۳۰	۱.۱۰.۱.۱	اجرای داربست نما / نمای اصلی / نما	۷ روز	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰.۴۶	اکیپ داربست ۴ نفره								
۸۳۱	۱.۱۰.۱.۲	زیرسازی فلزی نما / نمای اصلی / نما	۵۰ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱.۶۹	اکیپ جوشکاری ۲ نفره								
۸۳۲	۱.۱۰.۱.۳	رابیتس بندی / نمای اصلی / نما	۲۱ روز	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰.۷	اکیپ رابیتس بندی ۲ نفره								
۸۳۳	۱.۱۰.۱.۴	لوله گذاری الکتریکی و سیم کشی / نمای اصلی / نما	۱۸ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰.۶	اکیپ لوله گذاری الکتریکی ۲ نفره								
۸۳۴	۱.۱۰.۱.۵	سنگ کاری نما / نمای اصلی / نما	۹۰ روز	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱.۸۳	اکیپ سنگ کاری نما ۲ نفره								
۸۳۵	۱.۱۰.۱.۶	اجرای بند کشی و آبندی نما / نمای اصلی / نما	۱۷ روز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۰.۵۸	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره								
۸۳۶	۱.۱۰.۱.۷	نصب تجهیزات نورپردازی / نمای اصلی / نما	۱۷ روز	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰.۵۸	اکیپ نصب تجهیزات الکتریکی ۲ نفره								
۸۳۷	۱.۱۰.۱.۷	برچیدن داربست / نمای اصلی / نما	۳ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۰	اکیپ داربست ۴ نفره								
۸۳۸	۱.۱۰.۲	نمای پشتی / نما	۲۴ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۸									
۸۳۹	۱.۱۰.۲.۱	اجرای داربست نما / نمای پشتی / نما	۳ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۰.۲	اکیپ داربست ۴ نفره								
۸۴۰	۱.۱۰.۲.۲	سنگ کاری نما / نمای پشتی / نما	۱۳ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۰.۳۴	اکیپ سیمان کاری ۳ نفره								
۸۴۱	۱.۱۰.۲.۳	اجرای بند کشی و آبندی / نمای پشتی / نما	۸ روز	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۲۶	اکیپ سنگ کاری ۲ نفره								
۸۴۲	۱.۱۰.۳	نمای جانبی / نما	۲۴ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۷۵									
۸۴۳	۱.۱۰.۳.۱	اجرای داربست نما / نمای جانبی / نما	۳ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۰.۲	اکیپ داربست ۴ نفره								
۸۴۴	۱.۱۰.۳.۲	ایزوگام دیوار نما / نمای جانبی / نما	۱۱ روز	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۰.۳۸	اکیپ ایزولاسیون ۲ نفره								
۸۴۵	۱.۱۰.۳.۳	نقاشی روی ایزوگام / نمای جانبی / نما	۱۰ روز	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰.۱۷	اکیپ نقاشی ۱ نفره								

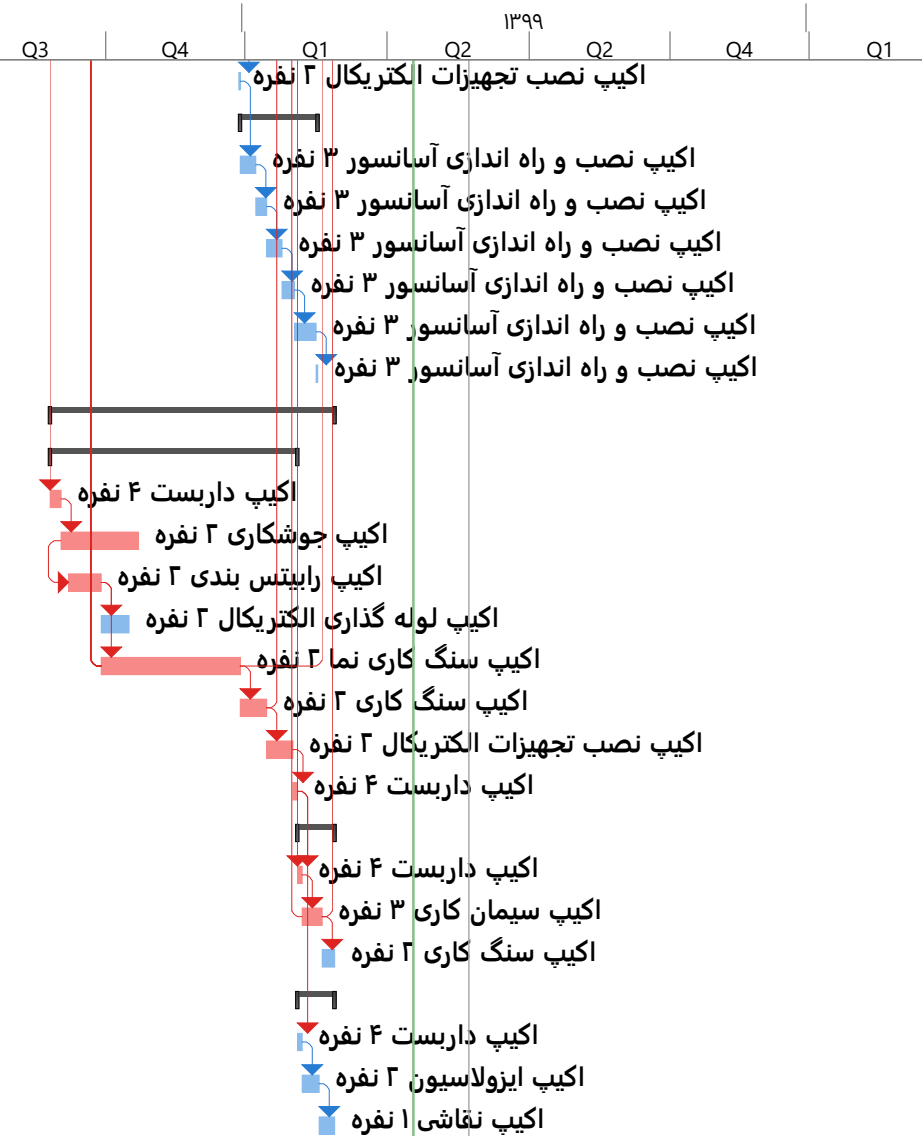

Project Planning Consultant: Farhad Jalali-09124851030	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
	Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			
